

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1251	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/24/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/01/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Strengthening Colombia's National Agency for Legal Defense of the State	<b>Loan Number</b>	4922/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
<b>Team Leader</b>	DE SIMONE, FRANCESCO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Colombia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1251	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	2,751,268.23	18.34%	12,248,731.77
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	2,751,268.23	18.34%	12,248,731.77

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

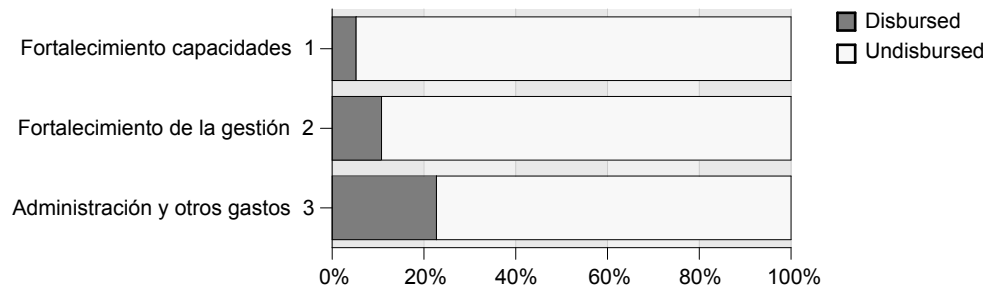

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Mejora en la eficiencia del SDJ en términos de ahorros potenciales reales

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Ahorros potenciales reales en millones de dólares	Ahorros potenciales reales medidos por los ahorros en los procesos en los que interviene o acompaña la ANDJE sobre el total de condenas/pretensiones	1,174.00	2018	2024	P	3,173.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** eKOGUI SIIF CHIP

**Observations:** 1 La relación condena /pretensión se calculó en 2018 en 30%. El programa contribuirá mediante ahorros potenciales reales medidos por  $\Sigma \text{Valor pretensiones iniciales} - \text{valor estimado de Condena /pretensión de los procesos con fallo favorable ij} + \Sigma (\text{pretensiones iniciales de fallos desfavorables} - \text{valor estimado de Condena /pretensión} - \text{condenas ij}) + \Sigma \text{Pretensiones de casos con laudo favorable ij} + \Sigma (\text{pretensiones iniciales de Laudos desfavorables ij} - \text{condenas ij}) + \Sigma (\text{total condenas a empleados públicos por acción de repetición}) + (\text{valor total de los levantamientos de recursos públicos inembargables}) + \Sigma (\text{pretensiones iniciales ij} - \text{valor conciliación extrajudicial aprobado})$ . Se escogió el indicador de ahorros potenciales reales y no ahorros potenciales porque se quiere mostrar un impacto atribuible a las acciones específicas a desarrollar en el marco del programa de acuerdo a la posibilidad real de éxito y no sobre las pretensiones totales sin tener en cuenta la relación condena/pretensión. 2 Cálculos realizados con una Tasa de Cambio de 1US\$ = COP\$3.151.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Aumento en la eficacia de las herramientas de defensa jurídica

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Porcentaje de reportes de información de conciliaciones prejudiciales en eKOGUI actualizados	No. de conciliaciones analizadas que fueron actualizadas/ No. de conciliaciones analizadas	18.00	2018	P	18.00	19.00	21.00	23.00	23.00
					A	27.50	22.70			

#### Details

**Means of verification:** eKOGUI

**Observations:** Se toma como variable proxi la actualización de la información en eKOGUI del estado de la conciliación para la entidad (activo ya terminado) tomando como fuente de contraste la información de la Procuraduría General de la Nación.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Aumento en la cobertura de procesos en los que interviene la ANDJE

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
2.0	Porcentaje de casos con mayores pretensiones en los que interviene la ANDJE	Casos en que interviene la ANDJE/ Total de casos	5.00	2018	P	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
					A	48.00	45.20			

#### Details

**Means of verification:** eKOGUI

**Observations:** 3 La ANDJE definió una estrategia de intervención judicial de los 500 procesos más cuantiosos, que representan el 68% de las pretensiones en contra del Estado por un valor de US\$81.000 millones. La estrategia está enfocada en 381 procesos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa (US\$34.000 millones) y 119 acciones de grupo (US\$46.900 millones). Así mismo, la agencia diseñó e inició la implementación de una estrategia de negociación en 208 de los 1.490 procesos interadministrativos, cuyas pretensiones equivalen al US\$960 millones, es decir al 97% del total de pretensiones en este tipo de procesos. Con esto se busca implementar soluciones amistosas a los litigios interadministrativos reduciendo el impacto fiscal que tienen y mejorando la articulación interinstitucional.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Aumento en la transferencia de conocimiento para la ANDJE y el SDJ

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
3.0	Porcentaje de certificación en herramientas de defensa jurídica con enfoque de género	Abogadas certificadas en defensa	8.00	2018	P	8.00	16.00	24.00	30.00	30.00
					A	19.37	62.00			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

3.0	Porcentaje de certificación en herramientas de defensa jurídica con enfoque de género	jurídica de ANDJE y SDJ/ Total de abogados del ANDJE y SDJ	8.00	2018						
Details										
Means of verification: eKOGUI										
Observations: 4 A la fecha del total de abogados (4.771) que defienden al Estado, el 32% son mujeres. De ellas se capacitaron 396 en 2018 equivalente al 8%.										
Pro-Gender	Yes					Pro-Ethnicity	No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las entidades del nivel nacional que hacen parte del SDJ

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.1	Modelo de Gestión Integral por resultados para la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	964,297	2,207,450
			P(a)	0	1	55,127	2,207,450
			A	0	0	0	175,036.79
1.2	Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	713,290	1,585,000
			P(a)	0	1	241,445	1,585,000
			A	0	0	77,725.21	178,239.26
1.3	Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio: (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales) diseñados	Productos y servicios	P	0	1	720,228	3,175,000
			P(a)	0	1	596,653	3,175,000
			A	0	0	27,923.3	84,036.84
1.4	Herramienta para la Gestión de Grupos de Interés (CRM) diseñada e implementada	Herramienta	P	0	1	495,157	1,190,000
			P(a)	0	1	359,510	1,190,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.1	Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados	Módulos	P	1	3	657,957	1,446,548
			P(a)	1	3	869,534	1,997,105
			A	0	0	129,710.25	292,890.83
2.2	Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramientas descriptivas de georreferenciación)	Herramientas	P	0	1	540,171	1,810,022
			P(a)	0	1	214,688	799,395
			A	0	0	57,834.51	151,547.46
2.3	Arquitectura de integración e interoperabilidad desarrollada e implementada	Modelo	P	0	1	180,057	837,304
			P(a)	0	1	54,043	892,500
			A	0	0	10,006.55	45,868.98
2.4	Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada	Estrategia	P	0	1	90,028	769,369
			P(a)	0	1	425,944	695,000
			A	0	0	18,770.26	155,104.99
2.5	Protecciones de ciberseguridad desarrolladas	Herramientas	P	0	1	133,917	311,722
			P(a)	0	1	232,282	595,000
			A	0	0	0	0
2.6	Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC ejecutado	Plan	P	0	1	180,057	595,085
			P(a)	0	1	155,922	791,050
			A	0	0	0	114,677.57

## Other Cost

Unidad Ejecutora	P			252,358	892,500
	P(a)			295,457	892,500
	A			91,063.37	267,050.86
Evaluaciones	P			0	80,000
	P(a)			0	80,000
	A			0	0
Auditorías	P			24,000	100,000
	P(a)			19,844	100,000
	A			8,226.4	21,399.95

Total Cost

	Total Cost	P			4,951,517	15,000,000
		P(a)			3,520,449	15,000,000
		A			421,259.85	1,485,853.53

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Internal Processes
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
