



Operation Number: **GU0177**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**  
Last Update: **6/6/2014**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**  
Division Chief validation date: **06/24/2014**  
Country Representative validation date: **07/07/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Project to Support the Penal Justice Sector	Loan Number:	1905/OC-GU,1905/OC-GU-1,1905/OC-GU-2,1905/OC-GU-3,1905/OC-GU-4,1905/OC-GU-5
Executing Agency (EA):	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ ,SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ ,ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA ,Ministerio Público ,Instituto de la Defensa Pública Penal ,MINISTERIO DE GOBERNACION, GUATEMALA		
Team Leader:	Santa Maria,Benjamin R.	Sector/Subsector:	MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
GU0177	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$170,020.00	\$0.00	\$30,170,020.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
GU0177	\$30,000,000.00	\$549,160.38	1.83%	\$29,450,839.62


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

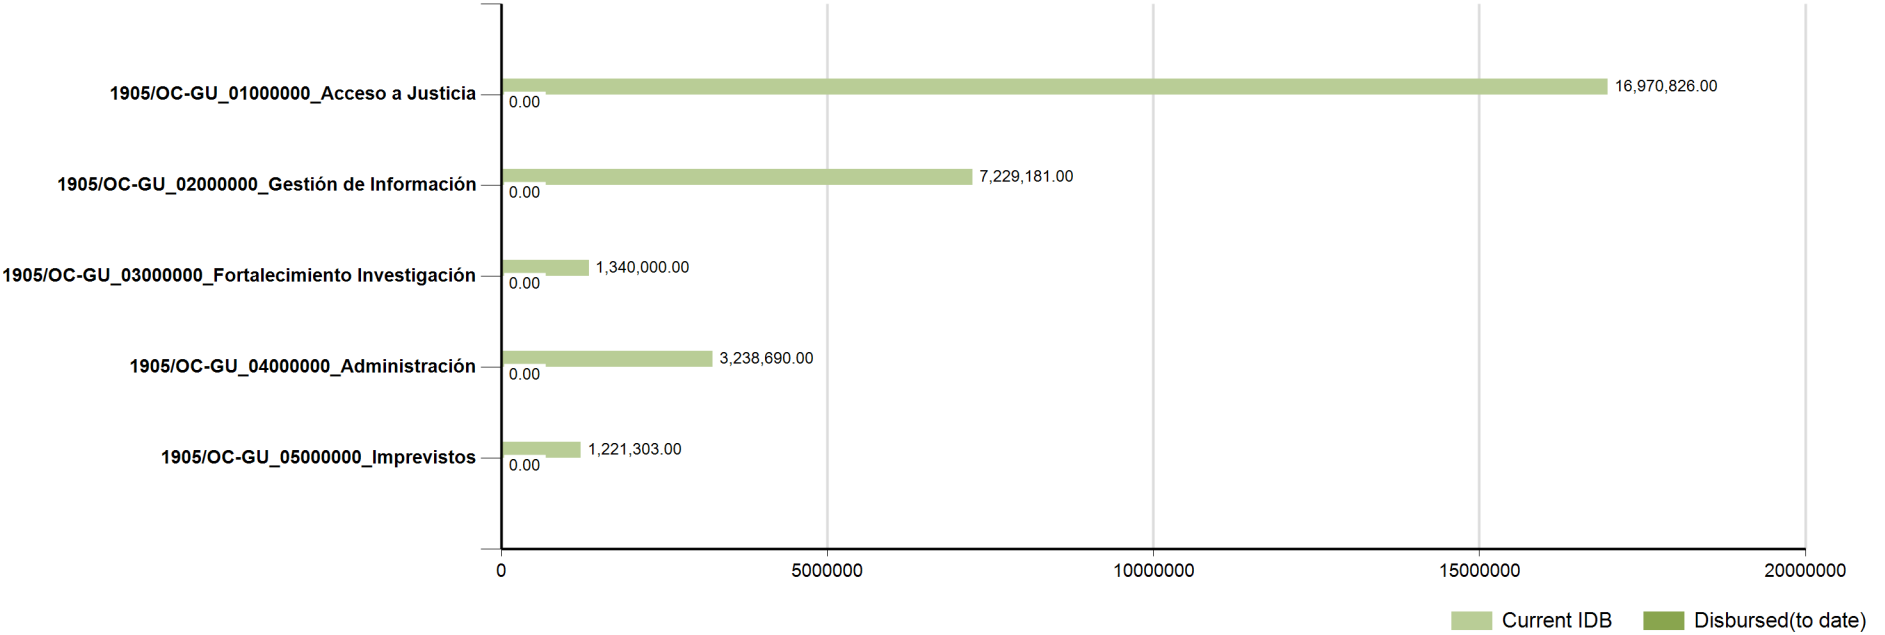

## Results Matrix

## Impacts

Impact:	1 Estado de Derecho fortalecido, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia penal.							
Observation:	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014: "Contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia pen							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.2 Aumentada en 10% la satisfacción de la población con respecto a los servicios de justicia en el área de influencia del programa.		%	0.00	2014	1. Estudio de Percepción del sistema de justicia penal (encuesta piloto y grupos de enfoque de víctimas, sentenciados y operadores); 2. Ventanilla de quejas, reclamos y satisfacción del servicio de los CJJP.	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

## Outcomes

[illegible]

Defensores Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 4; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]	<b>P</b>	
	<b>P(a)</b>	1.10
	<b>A</b>	
<b>Disaggregation Categories</b>		<b>EOP</b>
Ministerios Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 109; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]	<b>P</b>	
	<b>P(a)</b>	2.20
	<b>A</b>	
<b>Disaggregation Categories</b>		<b>EOP</b>
Policias de investigacion X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 75; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]	<b>P</b>	
	<b>P(a)</b>	2.20
	<b>A</b>	

1.1 Aumentado un 10% el numero de casos por tipo de delito que ingresan en el sistema de justicia penal segun perfil socioeconomico de las victimas e imputado (genero, edad, ocupacion y escolaridad)		%	130,794.00	2014	1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultoria s de evaluacion de resultados y avances	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	<b>P</b>	
							<b>P(a)</b>	143,873.00
							<b>A</b>	
1.2 Disminuida a 24 horas la duracion en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaracion ante el juez competente en los centros integrados de justicia penal (CIJP) [La línea de base es 30 dias promedio, equivalente a 720 horas]		Horas	720.00	2014	1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultoria s de evaluacion de resultados y avances	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	<b>P</b>	
							<b>P(a)</b>	24.00
							<b>A</b>	
1.3 Aumentado un 10% el numero de investigaciones abiertas por casos de homicidios y numero de investigaciones terminadas por casos de homicidios		%	42.00	2014	1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultoria s de evaluacion de resultados y avances	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	<b>P</b>	
							<b>P(a)</b>	46.20
							<b>A</b>	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Acceso a la Justicia.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la creación de centros integrados de justicia penal; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarías tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías. [Línea de base: 5 centros de justicia ; 0 regionales del IDPP; 270 comisarías; 57 fiscalías distritales; y 24 remodelaciones de juzgados de paz]	Centros/Sedes/Juzgados/Comisarias/Fiscalías	P	0.00	13.00	P	1,116,826.00	6,324,826.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	1,116,826.00	16,970,826.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sedes regionales de la defensa penal construidos.	Sedes regionales	P	0.00	5.00	P	201,000.00	3,646,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Juzgados de Paz remodelados.	Juzgados de Paz	P	0.00	15.00	P	175,000.00	2,355,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Comisarías Tipo Construidas.	Comisarías tipo	P	0.00	5.00	P	100,000.00	2,103,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Fiscalías construidas.	Fiscalías	P	0.00	5.00	P	151,000.00	2,267,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones participantes [4 coejecutores] con datos homogéneos y confiables para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Sistema de Gestión	P	0.00	1.00	P	5,114,540.00	7,179,181.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	5,114,540.00	7,229,181.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Programa	P	0.00	1.00	P	203,540.00	343,540.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	203,540.00	1,340,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.	Equipo	P	1.00	1.00	P	401,460.00	401,460.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	
		A			A		
Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.	Unidades de trabajo	P	0.00	1.00	P	169,540.00	238,540.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba.	Protocolo forense	P	0.00	1.00	P	176,460.00	226,460.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Gestión del Programa							

Other Cost		2013	Cost
Administración	P	\$1,038,750.08	\$2,838,690.00
	P(a)	\$1,038,750.08	\$3,238,690.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P	\$400,000.00	\$1,221,303.00
	P(a)	\$400,000.00	\$1,221,303.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$9,248,116.08	\$29,145,000.00
	P(a)	\$7,873,656.08	\$13,951,072.00
	A		

## Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Información de 4 coejecutores indispensable para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables, activo.	Delete Output	Se mantiene el indicador. Esta modificacion registrada es resultado de la primera navegacion en el nuevo PMR.	5/20/2014	5/1/2014
Output	Información de 4 coejecutores indispensable para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables, activo.	Create Output	Se mantiene el indicador. Esta modificacion registrada es resultado de la primera navegacion en el nuevo PMR.	5/20/2014	5/1/2014
Outcome	Aumentado un 10% el numero de investigaiones abiertas por casos de homicidios y numero de investigaciones terminadas por casos de homicidios	Create Outcome Indicator	Se mantiene el indicador. Esta modificacion registrada es resultado de la primera navegacion en el nuevo PMR.	5/19/2014	5/1/2014
Outcome	Disminuida a 24 oras la duracion en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaracion ante el juez competente en los centros integrados de justicia penal (CIJP)	Create Outcome Indicator	Se mantiene el indicador. Esta modificacion registrada es resultado de la primera navegacion en el nuevo PMR.	5/19/2014	5/1/2014
Outcome	Aumentado un 10% el numero de casos por tipo de delito que ingresan en el sistema de justicia penal segun perfil socioeconomico de las victimas e imputado (genero, edad, ocupacion y escolaridad)	Create Outcome Indicator	Se mantiene el indicador. Esta modificacion registrada es resultado de la primera navegacion en el nuevo PMR.	5/19/2014	5/1/2014
Outcome	Aumentada un 10% la cobertura poblacional de los servicios de justicia en el area de influencia del programa	Create Outcome Indicator	Se mantiene el indicador. Esta modificacion registrada es resultado de la primera navegacion en el nuevo PMR.	5/19/2014	5/1/2014
Outcome	Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.	Delete Outcome	Se mantiene el indicador. Esta modificacion registrada es resultado de la primera navegacion en el nuevo PMR.	5/19/2014	5/1/2014
Outcome	Disminuido en 50% el número de detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJP. E inversamente se incrementa en 20 % el número de procesamientos.	Delete Outcome Indicator	Es un indicador que fue eliminado porque es inviable medir 'la ilegalidad' actualmente en las instituciones participantes, ya que de ello no se hace un registro administrativo. La Ayuda-Memoria y sus anexos, firmada con el Organismo Ejecutor, de fecha 24 de abril de 2014 se encuentra en IDBDOCS#38812519-v2-Firma de Ayuda de Memoria.	5/19/2014	5/1/2014
Outcome	Incrementado de 7 a 24 el número de horas y 5 a 7 días semanales la disponibilidad del servicio de justicia penal. En el área de influencia del Programa.	Delete Outcome Indicator	Este indicador se eliminó debido que en una evaluación/diagnóstico del funcionamiento de los juzgados penales de turno con 24 horas, las instituciones decidieron continuar con el modelo pero en su conjunto no se incluyó el funcionamiento durante las 24 horas. La Ayuda-Memoria y sus anexos, firmada con el Organismo Ejecutor, de fecha 24 de abril de 2014 se encuentra en IDBDOCS#38812519-v2-Firma de Ayuda de Memoria.	5/19/2014	5/1/2014
Outcome	Aumentado en 25 % el número de casos conocidos y resueltos.	Delete Outcome Indicator	Se eliminó porque el objetivo del componente 1, y su conexion con el resto de componentes, se limita principalmente a medir acceso a la justicia, no eficiencia, por ello se cambio a un indicador que caracteriza la demanda del servicio de justicia. La Ayuda-Memoria y sus anexos, firmada con el Organismo Ejecutor, de fecha 24 de abril de 2014 se encuentra en IDBDOCS#38812519-v2-Firma de Ayuda de Memoria.	5/19/2014	5/1/2014

Impact	Aumento del 25 % la cobertura poblacional de los servicios de justicia en el área influencia del programa.	Delete Impact Indicator	Idem	5/19/2014	5/1/2014
--------	--	-------------------------	------	-----------	----------

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
